




I. INFORME AL MES DE OCTUBRE DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN UNA CDMX CADA VEZ MÁS RESILIENTE.







#### I.1 PRESENTACIÓN

El presente informe, integra los avances en las diferentes acciones que llevaron a cabo las dependencias a 13 meses del sismo, para ello la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más Resiliente, ha priorizado la aprobación de acciones que brinden el apoyo correspondiente a las personas afectadas por el pasado 19S.

Al corte de la Trigésima Sexta sesión ordinaria, la Comisión tiene autorizadas 48 acciones destinadas a la Reconstrucción de la CDMX, éstas contemplan un monto total de \$5,576,289,864.12, donde intervienen 12 instancias ejecutoras, que son: Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE), Secretaría Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI), Secretaría de Educación (SEDU); Instituto de Vivienda (INVI), Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), Agencia de Gestión Urbana (AGU), Sistema de Aguas de la CDMX (SACMEX), Secretaría de Gobierno (SEGOB), Secretaría de Salud (SEDESA), Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) y Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR).

# Planes de acción aprobados por la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más Resiliente.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2018, y en un ejercicio de rendición de cuentas se enlistan los planes de acción aprobados, con corte de la Trigésima Quinta sesión ordinaria del día 17 de octubre de 2018.

Unidad Responsable del Gasto	Nombre de la acción autorizados por la Comisión	Recursos Asignado por SEFIN
	Obras y acciones de reconstrucción, competencia local, autorizadas como contraparte del programa FONDEN	\$236,843,870.00
Sistema de Aguas de la Ciudad de México	2 Obras adicionales de agua potable, para reconstrucción, recuperación y transformación	\$108,682,000.00
	3 Obras adicionales de drenaje, para reconstrucción, recuperación y transformación	\$198,771,000.00
	4 Demoliciones de edificios	\$428.668.000,00
	5 Servicio de atención a daños menores	\$20,000,000.00
	6 Construcción de la carretera Xochimilco-Tulyehualco	\$240,000,000.00
	7 Mejoramiento del suelo por inyecciones en Tláhuac y Xochimilco	\$100,000,000.00
Secretaría de Obras y	8 Demolición, retiro y construcción de puentes peatonales Xochimilco-Tlalpan	\$21,504,742.00
Servicios de la Ciudad	9 Gerencia de proyectos	\$45,000,000.00
de México	10 Apoyo técnico	\$18,500,000.00
	11 Servicios de coordinación técnica y de campo para demoliciones, reestructuraciones y reparaciones de inmuebles afectados en Tláhuac y Xochimilco	\$36,000,000.00
	12 Arrendamiento de puentes peatonales provisionales, ubicados sobre Anillo Periférico, a la altura de calle Cañaverales y Av. Canal Nacional en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco.	\$9,157,000.00





# Planes de acción aprobados por la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más Resiliente.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2018, y en un ejercicio de rendición de cuentas se enlistan los planes de acción aprobados, con corte de la Trigésima Quinta sesión ordinaria del día 17 de octubre de 2018.

Unidad Responsable del Gasto	Nombre de la acción autorizados por la Comisión	Recursos Asignado por SEFIN
	13 Estudios de mecánica de suelos, elaboración y entrega de informes por predio en las colonias Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa	\$28,550,000.00
	14 Rehabilitación de escuelas	\$66,750,000.00
	15 Carga transporte y disposición final de cascajo	\$70,000,000.00
Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad	16 Demolición de inmuebles	\$133,750,000.00
de México	17 Pavimentación de vialidades primarias y secundarias	\$807,620,745.87
	28 Carga, transporte y disposición final de cascajo generado en las diferentes Delegaciones de la Ciudad de México	\$130,000,000.00
	19 Aportación CDMX para el cuarto pago a beneficiarios por reconstrucción con recursos FONDEN	\$85,061,884.00
	20 Elaboración de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	\$2,500,000.00
Secretaría de Desarrollo Urbano y	21 Equipo de apoyo para certificación de inmuebles de reconstrucción y otros estudios	\$8,354,296.80
Vivienda	22 Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción	\$110,000,000.00
	23 FIDEICOMISO PÚBLICO	\$775,426,859.61
	24 Proyectos Ejecutivos	\$1,098,625.00
	25- Programa de restauración del Patrimonio Cultural de Monumentos Históricos de la CDMX	\$22,831,557.00
	26 Coordinación y seguimiento de las obras y acciones de reconstrucción.	\$5,495,000.00
	27 Convenio para reconstrucción de escuelas SEDU- Agencia de Gestión Urbana.	\$75,000,000.00
	28 Aportación al Instituto para la Seguridad de las Construcciones para el Otorgamiento de verificaciones de Seguridad Estructural a planteles educativos de la CDMX	\$57,000,000.00
Secretaría de	29 Adquisición de materiales y equipamiento para la reconstrucción, rehabilitación y habilitación de escuelas públicas.	\$58,000,000.00
Educación de la Ciudad de México	30 Campaña "Respuesta ante una emergencia sísmica", material didáctico.	\$4,000,000.00
	31 Distribución de gabinetes para la atención emergente de siniestros en escuelas públicas.	\$52,000,000.00
	32 Convenio para el Diagnóstico e Implementación de la Estrategia "Hacia una Ciudad del conocimiento resiliente".	\$9,000,000.00
	33 Convenio para la implementación de Protocolos para la atención de la emergencia en el sector educativo.	\$9,000,000.00
	34 Aportación al Instituto para la Seguridad de las Construcciones para revisiones estructurales a planteles educativos de la CDMX	\$7,505,000.00
Instituto de Verificación	35 Retiro de anuncios en azoteas	\$63,000,000.00





# Planes de acción aprobados por la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más Resiliente.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 14 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 2018, y en un ejercicio de rendición de cuentas se enlistan los planes de acción aprobados, con corte de la Trigésima Quinta sesión ordinaria del día 17 de octubre de 2018.

Unidad Responsable del Gasto	Nombre de la acción autorizados por la Comisión	Recursos Asignado por SEFIN
Administrativa de la Ciudad de México		
	36 Reforzar acciones de vivienda	\$150,000,000.00
	37 Créditos emergentes para reconstrucción de vivienda	\$654,000,000.00
	38 Otorgamiento de apoyo para renta	\$116,000,000.00
Instituto de Vivienda de la Ciudad de México	39 Programa piloto de carácter temporal para el otorgamiento de financiamiento no recuperable hasta por \$450,000,00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N), para la reconstrucción de vivienda en lote familiar dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda.	\$13,500,000.00
	40 Otorgamiento de Financiamiento no recuperable a través del Programa de Vivienda en conjunto para la edificación del edificio 1C del Multifamilliar Tlalpan.	\$30,000,000.00
Instituto para la Seguridad de las	41 Personal de apoyo para seguimiento a la reconstrucción y DRO	\$30,645,000.00
Construcciones	42Proyecto estructural de rehabilitación	\$100,000,000.00
Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario	43 Reconstrucción de los Centros Penitenciarios afectados por el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017	\$387,500,000.00
Secretaria de Salud de	44 Reubicación temporal de los Centros de Salud Santa Rosa Xochiac.	\$830,815.20
la Ciudad de México	45 Reubicación temporal de los Centros de Salud Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda	\$1,770,661.86
Secretaría de	46 Rehabilitación del mercado Abraham del Llano-Nopalera	\$4,016,000.00
Desarrollo Económico	47 Rehabilitación del mercado General Felipe Astoga Ochoa	\$4,019,000.00
Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a través de la Dirección General Jurídica de Estudios Legislativos	48 Adquisición de anaqueles para sustituir a aquellos que fueron colapsados en el Archivo General de Notarias (Acervo A y B).	\$38,937,807.00
	Gran Total	\$5,576,289,864.12
		, , ,

Tabla 1 Acciones aprobadas por la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una CDMX cada vez más Resiliente.

Adicional a lo anterior, como ya se ha reportado, la Comisión reservó \$100,000,000.00 para el FONADEN, solicitados por SEFIN y en cumplimiento al Art. 14, segundo párrafo de la fracción I, lo que representa un total de **\$5,676,289,864.12.** 





El pasado 4 de octubre de 2018, se realizó una modificación al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2018, modificando los montos establecidos en el artículo 14 del mismo de la siguiente forma:

Artículo 14.- Adicionalmente a las erogaciones establecidas en los artículos 5, 6, 7, 8, 10 y 11 del Decreto, se consideran \$8,972,000,000 pesos para acciones de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México:

- I. Derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017, dentro de las erogaciones de este decreto se destinan \$6,318,000,000 pesos para el Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, como se mandata en la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, en una cada vez más Resiliente; de los cuales \$718,000,000 pesos deberán ser asignados directamente al Fideicomiso público para reconstrucción y rehabilitación de viviendas de uso habitacional.
- II. ...

Para la rehabilitación de vialidades, mejoramiento de la infraestructura y del espacio público se asignan \$1,209'000,000 de pesos a la Agencia de Gestión Urbana; para el mantenimiento y rehabilitación de centros educativos, así como para el fortalecimiento de las acciones educativas se asignan \$277,000,000 de pesos a la Secretaría de Educación; para reforzar las acciones de vivienda se consideran \$150,000,000 de pesos para el Instituto de Vivienda.

Cabe aclarar que aún no se han realizado movimiento con respecto a esta última modificación.

Por otro lado, la Comisión, al corte de la Trigésima Sexta sesión ordinaria, se ha pronunciado respecto de la procedencia de 175 inmuebles para otorgamiento del financiamiento para el pago del proyecto ejecutivo, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Apoyo	Número de inmuebles	Tipo de daño	Instancia responsable
Droveste ejecutive	138	Rehabilitación	ISC
Proyecto ejecutivo	37	Reconstrucción	SEDUVI
Total	175	procedentes	

Tabla 2. Total de inmuebles procedentes para pago de proyecto ejecutivo. Fuente: ISC, SEDUVI y Trigésima Sexta sesión ordinaria

Durante este periodo no se presentó información por parte de las siguientes dependencias:

- Secretaría de Desarrollo Económico
- Secretaría de Desarrollo Social
- Secretaría de Protección Civil





#### PROGRESO DE LAS ACCIONES

El análisis siguiente presenta el progreso acumulado de las acciones aprobadas por la Comisión, desde el inicio del proyecto hasta el 19 de octubre de 2018, donde se estima un 50.5% de avance global acumulado para las acciones aprobadas del proyecto que ya presentan algún avance. El mes pasado se estimó un avance del 40.2% por lo cual el avance mensual sería del 10.3%. La tabla siguiente presenta los porcentajes de avance estimados para cada acción a la fecha:

Acción	Responsable	% físico Sep	% físico Oct	Comentario
Carga transporte y disposición de cascajo	AGU	100%	100%	
Demolición de inmuebles	AGU	88%	94%	
Carga, transporte y disposición final de cascajo generado en las diferentes Delegaciones de la Ciudad de México	AGU	0%	31%	
Coordinar dichos Proyectos Ejecutivos de Reconstrucción.	SEDUVI	7%	12%	
Créditos emergentes para reconstrucción de vivienda	INVI	100%	83%	El % de avance baja porque el monto aprobado de la acción aumento desde el mes pasado (500MDP antes y 654MDP ahora)
Pavimentación de vialidades primarias y secundarias	AGU	72%	84%	
Rehabilitación de escuelas	AGU	50%	66%	
Personal de apoyo para seguimiento a la reconstrucción y DRO	ISC	44%	67%	
Proyecto estructural de rehabilitación.	ISC	15%	20%	
Obras adicionales de agua potable	SACMEX	30%	37%	
Obras adicionales de drenaje	SACMEX	47%	80%	
Obras y acciones de reconstrucción, autorizadas por FONDEN	SACMEX	78%	85%	
Otorgamiento de ayuda de renta	INVI	22%	13%	El % de avance baja porque INVI detalla este mes en su informe que del fondo de reconstrucción ejercieron nada más \$15,541,000.00. Lo reportado el mes anterior correspondía a 3 fuentes de financiamiento diferentes.





Acción	Responsable	% físico Sep	% físico Oct	Comentario
Programa de restauración del Patrimonio Cultural de Monumentos Históricos de la CDMX	SEDUVI	10%	0%	El % de avance del mes pasado era una estimación de la Gerencia de Proyecto pero ahora SEDUVI reporta en su informe que la acción esta por empezar.
Proyectos Ejecutivos	SEDUVI	0%	0%	
Reforzar acciones de vivienda	INVI	100%	100%	
Apoyo técnico	SOBSE	77%	81%	
Aportación al Instituto para la Seguridad de las Construcciones para el otorgamiento de Verificaciones de Seguridad Estructural a planteles educativos de la CDMX.	SEDU	0%	0%	
Aportación CDMX para el cuarto pago a beneficiarios por reconstrucción con recursos FONDEN	SEDUVI	90%	90%	
Construcción de la carretera Xochimilco-Tulyehualco	SOBSE	35%	40%	
Demoliciones de edificios	SOBSE	79%	79%	
Convenio para reconstrucción de escuelas SEDU-Agencia de Gestión Urbana.	SEDU	10%	17%	
Estudios de mecánica de suelos, elaboración y entrega de informes por Predio en las Colonias o Poblados ubicados dentro de la Delegación Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa de esta Ciudad de México.	SOBSE	1%	1%	
Equipo de apoyo para certificación de inmuebles de reconstrucción y otros estudios	SEDUVI	67%	80%	
FIDEICOMISO PÚBLICO	SEDUVI	0%	0%	
Mejoramiento del suelo por inyecciones en Tláhuac y Xochimilco	SOBSE	5%	5%	
Servicio de atención a daños menores	SOBSE	98%	99%	





Acción	Responsable	% físico Sep	% físico Oct	Comentario
Arrendamiento de puentes peatonales provisionales, ubicados sobre Anillo Periférico en Tlalpan y Xochimilco	SOBSE	50%	100%	
Demolición y retiro de puentes peatonales Xochimilco-Tlalpan	SOBSE	30%	44%	
Reconstrucción de los Centros Penitenciarios afectados por el pasado sismo del 19 de septiembre de 2017.	SssP	14%	35%	
Gerencia de proyectos	SOBSE	62%	88%	
Retiro de anuncios en azoteas	INVEA	0%	0%	
Reubicación temporal de los Centros de Salud Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda	SEDESA	10%	3%	Con el informe de este mes, la Gerencia ahora solamente estima un 3% de avance global para esta acción.
Reubicación temporal de los Centros de Salud Santa Rosa Xochiac	SEDESA	25%	35%	
Servicios de coordinación técnica y de campo para demoliciones, reestructuraciones y reparaciones de inmuebles afectados en Tláhuac Y Xochimilco	SOBSE	70%	100%	
Arrendamiento Puentes peatonales provisionales Tlalpan-Xochimilco - FASE 2	SOBSE	0%	50%	

Tabla 3. Porcentajes de avance físicos de las acciones que manifiestan avance. Fuente. Informes mensuales de las dependencias.

Las acciones aprobadas de la tabla siguiente no se toman en cuenta en el cálculo del avance global del proyecto, se está a la espera de contar con más información para estimar sus porcentajes de avance físicos.

Acción	Responsable	% físico Sep	% físico Oct	Comentarios
Rehabilitación del mercado Abraham del Llano-Nopalera	SEDECO	0%	0%	Acción en espera
Rehabilitación del mercado General Felipe Astoga Ochoa	SEDECO	0%	0%	Acción en espera





Acción	Responsable	% físico Sep	% físico Oct	Comentarios
Adquisición de materiales y equipamiento para la reconstrucción, rehabilitación y habilitación de escuelas públicas	SEDU	0%	0%	Acción en espera
Campaña "Respuesta ante una Emergencia Sísmica" Material didáctico	SEDU	0%	0%	Acción en espera
Distribución de Gabinetes para la Atención Emergente de Siniestros en Escuelas Públicas	SEDU	0%	0%	Acción en espera
Convenio para el Diagnóstico e implementación de la Estrategia "Hacia una Ciudad del Conocimiento Resiliente"	SEDU	0%	0%	Acción en espera
Convenio para la implementación del Protocolo para la atención de la emergencia en el Sector Educativo	SEDU	0%	0%	Acción en espera
Aportación al Instituto para la Seguridad de las Construcciones para revisiones estructurales a planteles educativos de la CDMX - FASE 2	SEDU	0%	0%	Acción en espera
Elaboración de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano	SEDUVI	0%	0%	En curso de cancelación
Coordinación y seguimiento de las obras y acciones de reconstrucción	SEDU	50%	0%	En curso de cancelación
Adquisición de anaqueles para sustituir a aquellos que fueron colapsados en el Archivo General de Notarias (Acervo A y B)	DGJyEL	0%	0%	Nueva 12/09
Programa piloto de carácter temporal para el otorgamiento de financiamiento no recuperable hasta por \$450,000,000, para la reconstrucción de vivienda en lote familiar dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda	INVI	0%	0%	Nueva 26/09
Otorgamiento de Financiamiento no recuperable a través del Programa de Vivienda en conjunto para la edificación del edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan	INVI	0%	0%	Nueva 10/10

Tabla 4 Acciones sin avance físico.
Fuente. Informes mensuales de las dependencias





La tabla y las curvas siguientes, presentan el progreso real del proyecto así como 3 proyecciones hasta el fin del mismo, tomando en cuenta diversos rendimientos mensuales:

- Proyección 1: Rendimiento promedio mensual de 12% (el doble que el actual) a partir de agosto 2018 (esperada).
- Proyección 2: Rendimiento promedio mensual del 14.8% a partir de agosto 2018 (para llegar a terminar el 100% de las acciones en 2018). (optimista).
- Proyección 3: Rendimiento del 6.5% (el rendimiento promedio ejecutado) hasta diciembre de 2018.
- Progreso real: Rendimiento real de los trabajos

Progreso del Proyecto de Reconstrucción con proyecciones estimadas									
	Mes	Progres	so Real	Proye	cción 1	Proye	cción 2	Proye	cción 3
	ene-18	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	feb-18	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	mar-18	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	abr-18	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
	may-18	6,5%	13,0%	6,5%	13,0%	6,5%	13,0%	6,5%	13,0%
	jun-18	6,5%	19,5%	6,5%	19,5%	6,5%	19,5%	6,5%	19,5%
	jul-18	6,5%	26,0%	6,5%	26,0%	6,5%	26,0%	6,5%	26,0%
	ago-18	4,1%	30,1%	12,0%	38,0%	14,8%	40,8%	6,5%	32,5%
	sep-18	10,1%	40,2%	12,0%	50,0%	14,8%	55,6%	6,5%	39,0%
	oct-18	10,3%	50,5%	12,0%	62,0%	14,8%	70,4%	6,5%	45,5%
D	nov-18			12,0%	74,0%	14,8%	85,2%	6,5%	52,0%
Proyección	dic-18			12,0%	86,0%	14,8%	100,0%	6,5%	58,5%



Imagen 1. Proyecciones y progreso real del proyecto de reconstrucción







# I.2 PLATAFORMA CDMX

Con base en las actualizaciones que se presentan en la Plataforma CDMX y que forman parte del cumplimiento de la Ley de Reconstrucción y el Programa de Reconstrucción, se pueden describir a continuación los cambios y mejoras que se realizaron durante este periodo:

 Dentro del apartado "Acerca de", en el desplegable Informes Mensuales de avances por Dependencia, se adicionaron los botones de filtro por mes, comenzando por el mes de marzo 2018 a agosto de 2018.

En estos apartados se muestran todas las Dependencias que emitieron informes en el periodo del mes seleccionado.



Imagen 2. Botones habilitados en el apartado de "Informes Mensuales de Avances por Dependencias" Fuente: Plataforma CDMX.

Se modificó en el apartado de "Fideicomiso", el subtítulo de ese contenido por "Acuerdos
y Actas del Comité Técnico del Fideicomiso para la Reconstrucción", mismo que
contiene los acuerdos aprobados durante las diferentes sesiones realizadas por dicho
Comité.







Imagen 3. Contenido de "Fideicomiso" Fuente: Plataforma CDMX.

 Como complemento al apartado de Censos, se incluyó la información correspondiente a: Censo de daños ocasionados a las actividades agrícolas de la CDMX, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), que contiene un documento en formato PDF, con información respecto a las afectaciones en el sector agrícola, provocadas por el 19S.



Imagen 4. Habilitación de "Censo de daños ocasionados a las actividades agrícolas de la CDMX (SEDEREC). Fuente: Plataforma CDMX





 Otra actualización, se encuentra en la pestaña "Ver más", en donde se habilitó la opción de "Información Adicional".

Dentro de este apartado se almacenarán documentos, archivos, enlaces e información otorgada por las Dependencias involucradas en la Reconstrucción de la CDMX. La información aquí presentada será toda aquella que no se encuentre dentro de los alcances de los informes mensuales o pueda ser considerada como información complementaria. Al día de hoy se encuentra habilitada la información de INVI.



Imagen 5. Contenido de "Información Adicional". Fuente: Plataforma CDMX.

 Como parte del complemento en la pestaña de "Ver más", se modificó el contenido de "Resiliencia sísmica", donde se puede visualizar el libro titulado: "Aprender del Sismo para ser más Resilientes", publicado por la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México (ARCDMX).







Imagen 6. Apartado de "Resiliencia Sísmica". Fuente: Plataforma CDMX.

Este libro se encuentra conformado por 8 apartados referentes a los sismos ocurridos en la Ciudad de México, haciendo hincapié en el 19S, así como la implementación de acciones que permitan prepararse y mitigar sus impactos.



Imagen 7. Libro "Aprender del Sismo para ser más Resilientes". Fuente: Plataforma CDMX.








#### 1.3 CENSOS


Para dar continuidad a las acciones que permiten conocer las condiciones reales de la Ciudad de México después del 19S; al corte del presente informe se tienen los siguientes datos:

### Censo de inmuebles afectados



Por lo que respecta a los dictámenes que el ISC ha entregado a la Comisión, se reportan los avances siguientes:


#### **DICTÁMENES ENTREGADOS POR ISC**

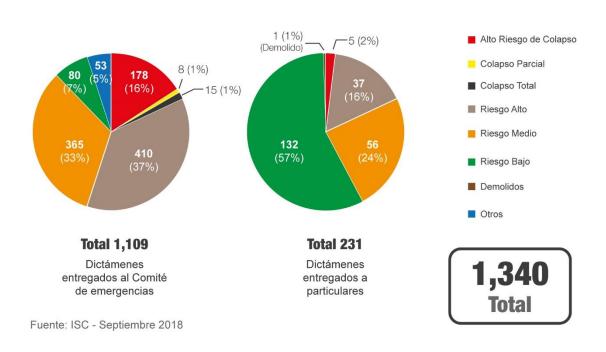





# **DICTÁMENES ENTREGADOS POR SEDUVI**



Fuente: SEDUVI - Septiembre 2018

Nota: estos datos tenderán a sufrir modificaciones derivado de la verificación de los dictámenes y de los trabajos que al efecto continúan desarrollando estas dependencias.

### Censo de mercados públicos, micro y pequeñas empresas afectados



Locales de mercados públicos, micro y pequeñas empresas afectados

2,951

\*CENSO SISMO SEDECO
- 17 de octubre 2018





#### Censo de infraestructura





\*Censo-infraestructura-salud 2018-08-10 (SEDESA) – Agosto 2018



\*SOBSE censo infraestructura - Septiembre 2018





\*Inmuebles-gob-cdmx (ISC) - Agosto 2018











\*Censo SACMEX 2018-09-18 - Septiembre 2018

\*FUENTE DEL CENSO

4,892

# Censo de Patrimonio Cultural Urbano e Histórico afectado



Patrimonio cultural urbano e histórico afectado

**399**\*SEDUVI
- Septiembre 2018

MÉXICO A 13 MESES DEL SISMO.

Censo de daños ocasionados a las actividades agrícolas de la CDMX y de las y los productores afectados



Actividades agricolas de productores afectados

**180**\*SEDEREC (censo de daños)
- 15 de octubre 2018

Página 17 de 61







### 1.4 ACCIONES SOCIALES RELEVANTES

PROSOC, siendo una instancia accesible a los particulares para la defensa de sus derechos sociales, y en virtud de la emergencia ocurrida el 19S, ha coadyuvado con las instancias e instituciones correspondientes en pro de la Reconstrucción de la CDMX, con acciones encaminadas al fortalecimiento de la organización condominal y la resiliencia de la población. Su contribución se encamina a que las personas afectadas logren acuerdos que les permitan tomar decisiones, para que de esta manera se agilice el proceso que les permita restablecer sus condiciones de vida de manera similar a las anteriores al 19S.

Para esto, reporta su participación en mesas de trabajo interinstitucional por medio de asesorías o charlas condominales con la siguiente colaboración:

TRABAJO INTERINSTITUCIONAL- PROSOC



ASESORÍAS CONDOMINALES - PROSOC



Fuente: PROSOC - Septiembre 2018

Fuente: PROSOC - Septiembre 2018

En el ámbito de las atribuciones establecidas en los "Lineamientos y Tabulador de Pagos de Proyectos de Rehabilitación y Reconstrucción, para inmuebles afectados por el "Fenómeno Sísmico del diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete", la dependencia también ha participado en las Asambleas Generales Ordinarias y Extraordinarias en donde se elige a la persona física o moral que tendrá la labor de llevar a cabo el proyecto, así como la recepción del financiamiento en la primera y segunda parte y la contratación de la misma.

Además de ver temas de concertación vecinal, su participación se presenta de la siguiente manera:





#### PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS - PROSOC



Fuente: PROSOC - Septiembre 2018

#### ATENCIÓN CIUDADANA DURANTE EL MES



# Asistencia Jurídica

Respecto a este programa, CEJUR reporta que durante el mes de septiembre, los usuarios atendidos se encuentran en proceso judicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde se promovieron juicios tendientes a la regularización de la propiedad de los bienes inmuebles que resultaron afectados.





MATERIA	ACCIÓN	USUARIOS ATENDIDOS
Civil	Otorgamiento y firma de escritura	2

Tabla 5. Usuarios atendidos. Fuente: CEJUR

Respecto a las actividades adicionales ejecutadas, se informa que se han celebrado reuniones de trabajo, convocadas por el Comisionado para la Reconstrucción, para brindar atención y seguimiento a los vecinos del grupo identificados como "Damnificados Unidos", en las instalaciones de SOBSE y SEGOB; de manera específica, en cuanto a los procesos de notificación de demolición llevados a cabo por personal de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General de Servicios Legales.

Por lo que respecta a las notificaciones realizadas por la Dirección General de Servicios Legales, se reportan 121 notificaciones a unidades privativas durante el mes de septiembre, para un total acumulado de 2,606 notificaciones.

En el Módulo Interinstitucional de Atención Administrativa Inmediata, durante el mes de septiembre, se atendieron 24 personas, para un total acumulado de 315. De esas 24 personas, se tienen 14 atenciones concluidas, y 10 trámites en proceso.

#### Programa de Vivienda en Conjunto

Con corte al 19 de octubre del presente año, INVI tiene considerados a 12 inmuebles de uso habitacional para llevar a cabo su reconstrucción. El número de edificaciones que forman parte del programa, se muestra a continuación en las siguientes dos tablas:

	No. de inmuebles a reconstruir						No. de inmuebles a reconstrui				
Estatus del inmueble	Junio	Julio	Agosto	Septiembre							
Demolidos y en proceso de reconstrucción	4	4	4	4							
En proceso de demolición	3	3	5	6							
Gestiones previas a demolición	1	4	3	3							
Total	8	11	12	13							

Tabla 6. Estatus mensual de inmuebles a reconstruir de junio a septiembre. Fuente: INVI

	No. de inmuebles a
Estatus del inmueble	reconstruir





	Octubre
Demolidos y en proceso de reconstrucción	5
En proceso de demolición	4
En proceso de integración de expedientes de reconstrucción*	3
Total	12**

Tabla 7 Estatus actual de inmuebles a reconstruir. Fuente: INVI

\*Como se puede observar para este mes, el INVI ha sustituido el estatus de "Gestiones previas a demolición" a "En proceso de integración de expedientes de reconstrucción".

\*\*La disminución de inmuebles se deriva a que en este mes, INVI no reportó la "Torre B" del inmueble localizado en Paseo de las Galias No. 47, que anteriormente había considerado como dos inmuebles (Torre "A" –en proceso de reconstrucción- y Torre "B" –en proceso de demolición-).

# RECONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES - INVI



Fuente: INVI - Septiembre 2018





# Cooperación y vinculación con el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México (CES CDMX)

En el mes de septiembre se reporta que, de los ocho estudios que se están realizando por parte del Comité Científico para la Reconstrucción y el Futuro de la CDMX, del Consejo Económico y Social, por un monto de \$14,969,364.22, seis están concluidos y dos en proceso.

En la Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Consejo Económico y Social, de fecha 27 de septiembre, se reportaron los siguientes avances:

Institución Responsable	Estudios	Fecha inicio- conclusión	Presupuesto (\$ pesos MN)	Recepción primer entregable	Recepción segundo entregable	Recepción tercer entregable	Status
Instituto de Ecología UNAM	Estudio sobre el estado actual de mantos acuíferos, la explotación de pozos, el abasto real y la demanda actual y potencial del líquido en la Ciudad.	11 junio – 11 octubre, 2018	\$988,158.76 (IVA INCLUIDO)	29 de junio	17 de agosto	17 de septiembre	Concluido
Instituto de Ecología Facultad de Arquitectura Instituto de Biología, UNAM.	Reglamento de la rezonificación de la Ciudad de México con elementos geofísicos, estructurales, socioeconómicos y ecológicos.	11 junio – 11 octubre, 2018	\$885,598.52 (IVA INCLUIDO)	29 de junio	17 de agosto	17 de septiembre	Concluido
CIDE	Formulación de modelos de precios hedónicos para la vivienda en la Ciudad de México.	11 junio – 11 octubre, 2018	\$3,870,000.00 (IVA INCLUIDO)	11 de julio	11 de agosto	14 de septiembre	Concluido
Fez-Iztacala, UNAM.	Adopción de un modelo de planeación sistémica y/ó estratégica para la construcción de protocolos de reacción relacionados con el impacto emocional en la población y el estrés postraumático	11 junio – 11 octubre, 2018	\$267,900.00 (IVA INCLUIDO)	11 de septiembre	3 de octubre	No hay tercer entregable	Concluido
COLMEX	Tecnologías de la información, aplicaciones tecnológicas y protección civil para una mayor capacidad de respuesta ante eventos extremos.	11 junio – 11 octubre, 2018	\$1,800,000.00 (IVA INCLUIDO)	11 de julio	11 de septiembre		En proceso
COLMEX	Adaptación a situaciones de certidumbre sísmica y	11 junio – 11 octubre, 2018	\$1,900,995.94 (IVA INCLUIDO)	11 de julio	11 de agosto	28 de septiembre	Concluido





Institución Responsable	Estudios	Fecha inicio- conclusión	Presupuesto (\$ pesos MN)	Recepción primer entregable	Recepción segundo entregable	Recepción tercer entregable	Status
	gestión de riesgos mediante SIG.						
Instituto de Investigacione s Sociales, UNAM	Los jóvenes del milenio: capital social y espacio público urbano ante el 19-S.	11 junio – 11 octubre, 2018	\$486, 150.00 (IVA INCLUIDO)	15 de agosto	10 de septiembre		En proceso
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad.  Instituto de Geografía.  Instituto de Ingeniería.	Nueva política de desarrollo urbano a escala metropolitana.	11 junio – 11 octubre, 2018	\$4,770,561.00 (IVA INCLUIDO)	11 de julio	11 de agosto	10 de septiembre	Concluido

Tabla 8 Proyectos en ejecución. Fuente: FES







#### 1.5 INFRAESTRUCTURA

# Programa para el Atlas de Riesgo: hacia un sistema de información de vulnerabilidades y riesgos

Dentro del Portal Oficial del Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México<sup>1</sup>, se pudo constatar que se presenta información de varios escenarios, con los que se pueden realizar análisis estadísticos en áreas específicas. Estos escenarios y su contenido se muestran en la siguiente tabla:

Escenario	Contenido
	Vulcanismo
	Geología Estructural
	Inestabilidad de laderas
	Sistemas de Topoformas
Geológicos	Litología
	Suelos
	Zonificación Geotécnica
	Hundimientos
	Zonificación Sísmica
	Hidrología
Hidrometeorológicos	Encharcamientos
Hidroffleteorologicos	Granizo
	Niebla
Químico tecnológicos	Derrames 2017
Quillico techologicos	<ul> <li>Incendios forestales</li> </ul>
	Suelo de conservación
Sanitario ecológicos	Residuos sólidos
	<ul> <li>Sitio de disposición Prados de la Montaña</li> </ul>
	<ul> <li>Concentraciones Masivas de Población</li> </ul>
Socio organizativos	Equidad de género
Socio organizativos	Refugios CDMX
	Transporte público
	Subsidencia cuadrante II-2017
	Fractura Zacapa 2017
Estudios	Subsidencia cuadrante I-2016
Estudios	<ul> <li>Fracturas Santa Catarina, Tláhuac 2014</li> </ul>
	Gritas y Hundimiento, Iztapalapa 2013
	Mapa de fracturas CENAPRED
Escenarios	19 de septiembre de 2017
Últimos sismos	Servicio Sismológico Nacional

Tabla 9. Escenarios que se incluyen en la versión 2.0 del Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Fuente:

Portal Oficial del Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> www.atlas.cdmx.gob.mx





Dentro del mismo Portal, se observó que esta nueva versión del Atlas contiene algunas herramientas e información disponible para su descarga en formatos PDF y SIG. Una breve descripción de este contenido se presenta en la tabla siguiente:

Menú	Descripción						
Herramientas	Contiene herramientas que permiten realizar análisis estadísticos, crear polígonos y medir distancias.						
Noticias	A la fecha de consulta, se encuentran los mapas de "Lluvia registrada" de los últimos tres días, de acuerdo a la distribución espacial de la lluvia registrada por las redes de la SPC, SACMEX, CONAGUA y UNAM.						
Estudios	Disponibles para su descarga, se encuentran los siguientes estudios:  - "Actualización de los Mapas de Riesgo e identificación de Peligros", UNAM 2014.  - "Zacapa", UNAM 2017.						
Mapas temáticos	Contiene algunos mapas para descargar en formato pdf, entre los que se encuentran: Altimétrico, Geológico, Inestabilidad de Laderas, Pendientes, Zonificación Geotécnica y Zonificación Sísmica.						
Datos abiertos	Está disponible la descarga de datos estadísticos en formato GeoJSON y SHAPE (Archivos de formato SIG) para Sistemas de Información Geográfica, entre los que se encuentran: Geológicos, Hidrometeorológicos, Químico Tecnológicos, Sanitario Ecológicos, Socio Organizativos, Estudios y Escenarios.						

Tabla 10. Herramientas e información adicional disponible en la versión 2.0 del Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México. Fuente: Portal Oficial del Atlas Público de Peligros y Riesgos de la Ciudad de México.

#### Programa de Atención y Tratamiento de Grietas

#### Instituto para la Seguridad de las Construcciones

ISC informa que está en proceso la ejecución de un estudio de investigación a cargo del Instituto de Ingeniería de la UNAM, denominado "Caracterización geotécnica del agrietamiento del suelo en las delegaciones Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, así como el impacto en las edificaciones de estas demarcaciones de investigación", el cual tiene un avance del 50% y está programado se concluya en diciembre de este mismo año.

El objetivo de este estudio es establecer un diagnóstico de los daños típicos inducidos por las grietas, y definir los rasgos estructurales de edificaciones e instalaciones que llevan a una mayor vulnerabilidad, así como proponer medidas de prevención y de mitigación del peligro asociado a las grietas.

#### Secretaría de Obras y Servicios

SOBSE informó que continúa realizando el mejoramiento de suelos en el tramo afectado de la carretera Xochimilco-Tulyehualco, a través de un proceso de perforación e inyección de mortero como parte de la acción denominada "Reconstrucción de la Carretera Vieja Xochimilco-





Tulyehualco", siendo la fecha de terminación estimada, de acuerdo al programa de ejecución presentado, el 23 de diciembre de 2018.

Para finales de octubre, se prevé tener un avance del 22.10%, de acuerdo al Programa de ejecución general de los trabajos de SOBSE.

Partida	Porcentaje de avance mensual programado (%)						
raitiua 	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	TOTAL		
Monitoreo de estructuras	10.00	28.00	40.00	22.00	100.00		
Mejoramiento de suelo	10.00	15.73	45.13	28.13	100.00		
Demoliciones, excavaciones y construcción	0.00	0.94	41.80	57.26	100.00		
Filtros, rellenos y restitución de vialidades	0.00	0.00	52.10	47.90	100.00		
Obra inducida	0.00	0.00	17.81	82.19	100.00		
Seguridad vial	10.00	26.00	40.00	22.00	100.00		
Porcentaje global mensual	8.32	13.77	45.49	32.42			
Porcentaje acumulado	8.32	22.10	67.58	100.00			

Tabla 11. Programa de ejecución general de los trabajos. Fuente: SOBSE.



Imagen 8. Vista general dirección oeste-este del área donde se ha realizado el mejoramiento de suelos en la Carretera Xochimilco-Tulyehualco. Fuente: Comisión.



Imagen 9. Vista dirección este-oeste del área con mejoramiento de suelos sobre la Carretera Xochimilco-Tulyehualco. Fuente: Comisión.

# Estudios de Mecánica de suelos en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa

La Comisión autorizó a SOBSE el plan de acción denominado "Estudios de mecánica de suelos, elaboración y entrega de los Informes por predio de las Colonias o Poblados ubicados dentro de las delegaciones Xochimilco, Tláhuac e Iztapalapa de esta Ciudad de México", cuyo monto es de \$28'550,000.00.





A la fecha SOBSE, ha realizado estudios en las colonias Del Mar, Agrícola Metropolitana, Villa Centroamericana y Miguel Hidalgo, pertenecientes a la delegación Tláhuac, con un avance del 86% en los estudios geológicos, geofísicos, geofécnicos, estratigrafías y diseño de mezclas.

En lo que respecta a los estudios en las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, SOBSE tiene pendiente presentar el programa de trabajo que seguirá para la ejecución de los mismos.

#### Programa de Demoliciones

Mediante este programa, se lleva a cabo la demolición de los inmuebles que resultaron severamente afectados tras el 19S, los cuales se encuentran dictaminados "para demolición" en la Plataforma CDMX. De acuerdo a la Ley de Reconstrucción, SOBSE es la instancia responsable del programa, aunque AGU se encuentra coadyuvando con la demolición de inmuebles de vivienda unifamiliar.

# Secretaría de Obras y Servicios

En la siguiente tabla se muestra el estatus mensual de los inmuebles, cuya demolición está a cargo de SOBSE:

Estatus	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre		
Estatus	No. de inmuebles							
Preliminares	8	5	8	7	2	3		
En proceso	8	7	4	4	4	7		
Concluidas	46	50	55	57	60	62		
Detenidas	0	0	0	6	10	6		
Total	62	62	67	74	76	78		

Tabla 12 Estatus de las demoliciones. Fuente: SOBSE

Lo anterior implica los siguientes porcentajes en cada rubro o etapa de la demolición para el actual mes:

Estatus	%
Preliminares	3.85
En proceso	8.97
Concluidas	79.49
Detenidas	7.69
Total	100


Tabla 13 Porcentajes de los estatus. Fuente: SOBSE





Derivado de las evaluaciones que se continúan realizando, ingresaron dos nuevos inmuebles al universo del Programa, teniéndose considerados ahora 78 edificaciones a demoler (76 el mes pasado).

Resalta el hecho de que el número de inmuebles que tienen detenidas las actividades de demolición por alguna problemática existente, disminuyeron en el periodo que se reporta (en agosto eran 10, actualmente se tienen 6).

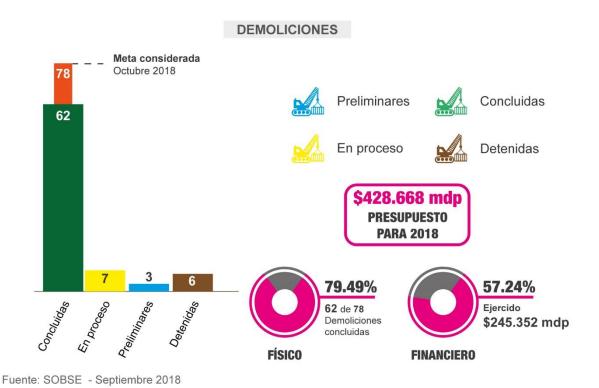

SOBSE tiene contemplado culminar con las actividades de demolición en la primera semana de diciembre del presente año.

Acción	Monto autorizado (MXN)	Monto ejercido acumulado (MXN)	% de avance
Demolición de edificios	428,668,000.00	245,352,932.54	57.24%

Tabla 14: Avance financiero acumulado. Fuente: SOBSE. La reducción del monto ejercido con respecto al mes anterior corresponde al ajuste por la determinación del ejercicio de los montos de acciones aprobadas por la Comisión.

### Agencia de Gestión Urbana


AGU realiza de igual manera, trabajos de demolición de inmuebles, teniendo como meta la demolición de 183,365 m³. El periodo de ejecución comprende del 16 de marzo al 15 de octubre





del presente año. Al 30 de septiembre, AGU informa un avance físico del 93.64%, al haber demolido 171,696 m3.

## AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DEMOLICIÓN DE INMUEBLES AGU



Fuente: AGU - Septiembre 2018

Acción	Monto autorizado (MXN)	Monto ejercido acumulado (MXN)	% de avance
Demolición de inmuebles	133,750,000.00	76,126,437.21	56.92

Tabla 15. Avance financiero acumulado. Fuente: AGU

Programas de Certificación de Derechos de Reconstrucción para Afectados (CeDRA 2017) y de Certificación Única de Reconstrucción de Vivienda (CURVI)

Estos programas a cargo de SEDUVI presentan un incremento de 7 CeDRAS 2017 expedidos y 2 CURViS ingresados con respecto al mes anterior, tal y como se muestra a continuación:








Cabe mencionar que dicha dependencia considera un universo de 79 inmuebles para el CeDRA 2017 (67 inmuebles el mes pasado) y 77 inmuebles para CURVi (65 inmuebles el mes pasado): el incremento del número de inmuebles elegibles explica la disminución del porcentaje de avance.

## Programa de Reforzamiento / Rehabilitación

En lo que respecta a este programa, ISC continúa con la atención de posibles beneficiarios del mismo, por lo que habiendo atendido a 695 personas y abierto 179 expedientes de inmuebles susceptibles a recibir el apoyo para el pago del proyecto de rehabilitación, de los cuales el ISC indicó que al corte del mes de septiembre presentó 120 expedientes a la Comisión y 18 más al 19 de octubre de 2018, de los cuales ya se dio la procedencia de la Comisión, se tiene un total al corte de la Trigésima Sexta sesión ordinaria de 138 expedientes y 41 que se encuentran en proceso de integración del correspondiente expediente para su posterior envío a la Comisión.

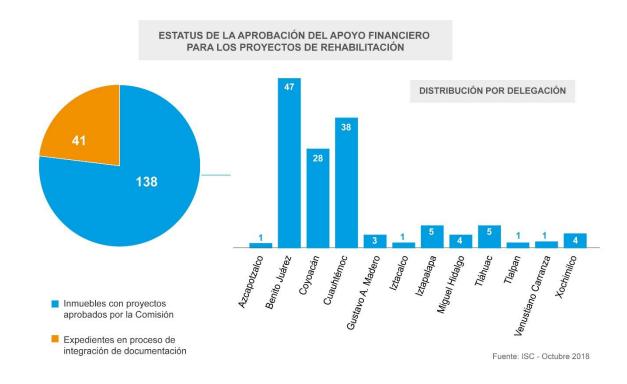

Por otra parte, el ISC reporta haber registrado 84 proyectos de rehabilitación en términos de lo establecido en los artículos 53 fracción I inciso g y 58 fracción I inciso i del Reglamento de Construcciones y la Norma Técnica Complementaria para la Revisión de la Seguridad Estructural de las Edificaciones y la Norma para la Rehabilitación Sísmica de Edificios de Concreto.






# Programa integral para la Restauración y Preservación del Patrimonio Histórico – Cultural

Como parte de este programa, SEDUVI continúa trabajando en el Censo de Patrimonio Cultural Urbano e Histórico afectado, realizando la identificación y caracterización de inmuebles a valorar a partir de la información que presenta el ISC ante el Comité de Emergencias de la CDMX y de los dictámenes técnicos emitidos por los Directores Responsables de Obra (DRO's), para SEDUVI.

En el informe del mes de septiembre emitido por SEDUVI, se presenta la cifra actualizada de inmuebles considerados para valoración, con un total de 10,520, de los cuales, en el último mes se revisaron 3,023 para un total de 7,834 inmuebles revisados, alcanzando con ello el 74% de avance en la conformación del censo. También se indica que la fecha estimada para el término de la integración del Censo de Patrimonio Cultural Urbano e Histórico afectado, es el 30 de noviembre de 2018.

De estos inmuebles revisados, respecto al mes anterior se tuvo un incremento de 44, para un total de 399 que se encuentran en el catálogo de Inmuebles considerados como Patrimonio Histórico-Cultural, bajo el resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), determinándose lo siguiente:

# CENSO DE PATRIMONIO CULTURAL URBANO E HISTÓRICO

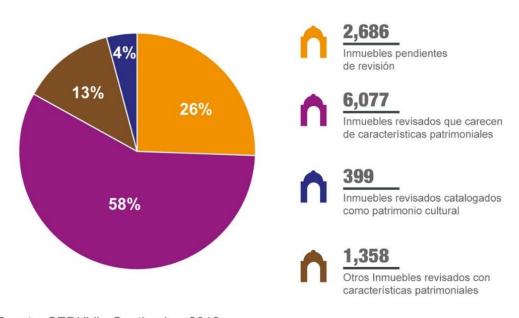

Fuente: SEDUVI - Septiembre 2018





SEDUVI también está llevando a cabo las acciones necesarias para identificar, integrar, coordinar y consolidar la información del Patrimonio afectado por el 19S, a fin de obtener un Diagnóstico que permita:

- Informar el estado actual del Patrimonio Cultural Urbano e Histórico afectado.
- Ubicar los inmuebles afectados en la Plataforma CDMX.
- Determinar el alcance de afectaciones del Patrimonio.

La información generada en el Censo de Patrimonio Cultural Urbano e Histórico afectado, servirá como base para la elaboración del "Plan de Rescate Integral" de inmuebles de valor histórico a cargo del INAH, de valor artístico a cargo del INBA y de valor patrimonial a cargo de SEDUVI, el cual tiene entre otros propósitos, alcanzar los siguientes objetivos:

- Definir zonas con mayor afectación.
- Determinar prioridades de atención.
- Precisar los procedimientos de intervención en el Patrimonio afectado.
- Crear mecanismos para realizar trabajos de recuperación del Patrimonio con instancias federales (INAH e INBA).
- Establecer mecanismos para la reconstrucción del Patrimonio.

Respecto a las acciones autorizadas por la Comisión denominadas "Proyectos Ejecutivos" y "Programa de restauración del Patrimonio Cultural de Monumentos Históricos de la CDMX", por un monto total de \$23'930,182.00, se informa que durante el mes de septiembre, se formalizó un Convenio de Colaboración entre SEDUVI, la Secretaría de Cultura CDMX (CULTURA) y el INAH, para implementar el plan de acción que permita el desarrollo de estas acciones.

#### Infraestructura Hidráulica

SACMEX continúa ejecutando las tres acciones que le han sido aprobadas por la Comisión, relacionadas con el Programa de Diagnóstico Postsísmico General de la Infraestructura Hidráulica de la CDMX, para lo cual realiza trabajos de reconstrucción y reparación de las redes de agua potable y drenaje en diversos frentes de trabajo localizados en distintas delegaciones, de acuerdo a lo que se muestra en la tabla siguiente:





ACCIONES DELEGACIONES

Obras y acciones de reconstrucción competencia local, autorizadas como contraparte del FONDEN:

Trabajos de reconstrucción de las redes hidráulicas (agua potable y drenaje)

 En 6 delegaciones: Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Obras adicionales de agua potable, para reconstrucción, recuperación y transformación:

 En 7 delegaciones: Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan.

Obras adicionales de drenaje, para reconstrucción, recuperación y transformación

o En 3 delegaciones: Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco.



Tabla 16 Delegaciones donde SACMEX ejecuta los trabajos relacionados con las acciones aprobadas. Fuente: SACMEX.

Para dichas acciones, SACMEX reporta los avances acumulados mensuales que se muestran en la tabla siguiente:

Acción	Avance acumulado al cierre de mes (%)						
Accion	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	
Obras y acciones de reconstrucción competencia local.	26%	43%	60.99%	70.73%	77.65%	84.59%	
2. Obras adicionales de agua potable.	25%	25%	32%	32%	32%	37.28%	
3. Obras adicionales de drenaje.	20%	20%	20%	34.15%	47.08%	79.77%	

Tabla 17 Avance porcentual acumulado de las acciones realizadas por SACMEX. Fuente: SACMEX

Adicionalmente, SACMEX lleva a cabo trabajos de reposición de líneas de agua potable y tomas domiciliarias en las delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc e Iztapalapa, al amparo de la acción "Obras y acciones de atención a emergencia, competencia federal, autorizadas como de Reconstrucción del Fideicomiso 2003 FONDEN", los cuales presentan un avance acumulado del 81.63%.






#### Infraestructura Urbana

Debido a que las actividades referentes al retiro de cascajo y escombros es una de las acciones que más han solicitado diversas delegaciones de la CDMX, AGU continúa realizando dichas labores (previamente ha concluido dos etapas, con montos de 20 y 50 millones de pesos, respectivamente), teniendo como nueva meta para la tercera etapa (por 130 millones de pesos) el retiro de diversos materiales por un total aproximado de 374,082.42 m³ en el periodo comprendido del 24 de agosto al 30 de noviembre del presente año.

Con corte al 30 de septiembre, AGU reporta un avance del 31.25%, al haber realizado retiros de escombro por un volumen total acumulado de 116,909 m³.



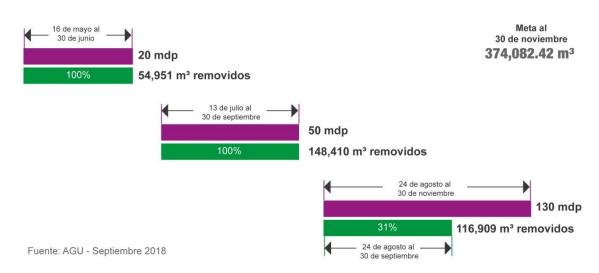

#### Pavimentación de vialidades primarias y secundarias.

La Comisión aprobó a AGU, como instancia encargada de dar atención a la infraestructura vial de la CDMX que resultó afectada por el 19S, la acción denominada "Pavimentación de vialidades primarias y secundarias", cuyo monto es de \$807,620,745.87.

La Agencia reporta que con corte al cierre de septiembre, presenta un avance físico del 83.66% en los trabajos de pavimentación; debido a la temporada de lluvias o al traslape con algunos trabajos de rehabilitación de la red hidráulica a cargo de SACMEX, proyecta su conclusión para finales del mes de octubre.


Por otro lado, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, lleva a cabo la verificación mediante pruebas de laboratorio, de que los materiales empleados se ajusten a la calidad de las especificaciones generales y particulares que establece la diversa normatividad





y a los términos contractuales, en lo que respecta a 15 contratos relacionados con las labores que AGU realiza respecto a la repavimentación.

## AVANCE FÍSICO-FINANCIERO PAVIMENTACIÓN AGU



Fuente: AGU - Septiembre 2018

Acción	Monto autorizado	Monto ejercido	% de
	(MXN)	acumulado (MXN)	avance
Pavimentación de vialidades primarias v secundarias	807,620,745.87	298,339,085.19	36.94%

Tabla 18 Avance financiero acumulado. Fuente: AGU.

# Demolición y retiro de puentes peatonales Xochimilco – Tlalpan y arrendamiento de puentes peatonales provisionales

En relación con los dos puentes peatonales que colapsaron parcialmente, SOBSE ha indicado que la meta es la construcción de ambos puentes para finales del mes de noviembre del presente año, reportando los siguientes avances:

 Acerca del puente peatonal de Anillo Periférico esquina Av. Canal Nacional, colonia Unidad Habitacional del Hueso Periférico, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco.

Trabajos realizados	Levantamiento topográfico, habilitado de acero, excavación para la demolición de zapata existente, habilitado de estructura metálica.	
Periodo de ejecución	25 de agosto al 07 de noviembre de 2018	

 Con relación al puente de Anillo Periférico esquina Cañaverales, Col. Granjas Coapa, en las delegaciones Tlalpan y Xochimilco.





Trabajos realizados


Levantamiento topográfico, ejecución de calas para ubicar tuberías de PEMEX, corte y excavación para la construcción de zapatas, demolición de zapata existente para la construcción de la nueva zapata, habilitado de estructura para el puente

Periodo de ejecución

28 de agosto al 10 de noviembre de 2018

#### Infraestructura educativa

#### INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

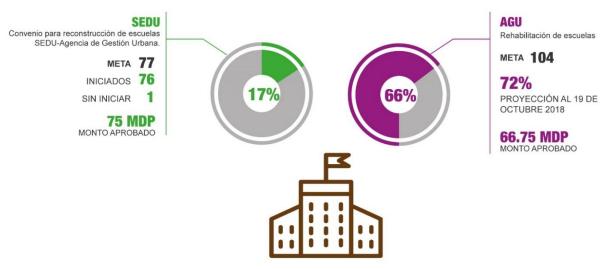

Fuente: SEDU y AGU - Septiembre 2018

## Agencia de Gestión Urbana

AGU lleva a cabo las siguientes acciones en relación con la infraestructura educativa afectada por el 19S:

#### Rehabilitación de Escuelas

La Comisión aprobó este plan de acción a AGU a fin de efectuar la reparación de daños menores de 104 planteles educativos, y en el informe del mes de septiembre, reporta los siguientes avances físicos globales:





ACTIVIDAD		Septiembre			Octubre				
(conceptos)		Semana			Semana				
	REHABILITACIÓN DE ESCUELAS	1	2	3	4	1	2	3	4
1	% Avance a la fecha	53.13	56.97	61.88	65.63	69.00	72.00		

Tabla 19 Avances físicos globales de "Rehabilitación de infraestructura educativa 2018". Fuente: AGU.

Este porcentaje de avance representa el avance físico global de los 104 frentes de trabajo que atiende la Agencia, los cuales se agrupan de la siguiente manera de acuerdo al rango de avance de los trabajos:

Rango de avance (%) de los trabajos	Cantidad de frentes de trabajo
0 – 24	13
25 – 49	6
50 - 74	7
75 – 95	19
96 – 99	28
100	31
Total	104

Tabla 20 Porcentajes de avance en frentes de trabajo en planteles educativos. Fuente: AGU.

Acción	Monto autorizado	Monto ejercido acumulado	% de avance
Rehabilitación de escuelas	\$66,750,000.00	\$13,634,172.50	20.43

Tabla 21 Avance financiero acumulado. Fuente: AGU.

## Convenio para Reconstrucción de Escuelas SEDU-AGU

SEDU celebró un Convenio de participación conjunta con AGU para que ésta lleve a cabo la rehabilitación, reparación y/o reconstrucción de planteles educativos a través de la acción "Convenio para reconstrucción de escuelas SEDU-AGU", que fue aprobada a SEDU, y cuyo monto es de \$75,000,000.00. El reporte de avance de esta acción se presenta más adelante, en la parte correspondiente a SEDU.





#### Secretaría de Educación

De las acciones aprobadas a SEDU se presenta el siguiente avance:

### Coordinación y seguimiento de las obras y acciones de reconstrucción

Con respecto a esta acción, SEDU informó que al no disponer de la definición de los inmuebles que serían atendidos con esta acción, no está en posibilidades de ejercer los \$5,495,000.00 aprobados para la "Coordinación y seguimiento de las obras y acciones de reconstrucción", por lo que solicitó la cancelación de esta acción.

### Convenio para Reconstrucción de Escuelas SEDU-AGU

AGU informa que para este Plan de Acción, SEFIN le entregó recursos (\$75,000,000.00) el 5 de septiembre del 2018 y se tiene un avance físico del 16.7%.

Inicialmente el alcance del Convenio consideraba realizar obras de reconstrucción y/o rehabilitación en 88 planteles educativos, cantidad susceptible a modificar por voluntad de las partes, por lo que este mes, SEDU informó que se consideraron 90 planteles educativos, de los cuales 13 han sido cancelados, derivado de esto el total de inmuebles por atender con esta acción es de 77 escuelas, las cuales conforme al avance que presentan los trabajos, se agrupan en los rangos que se muestran en la siguiente tabla:

Rango de avance (%) de los trabajos	Cantidad de escuelas
0 – 24	65
25 – 49	0
50 - 74	1
75 – 95	5
96 – 99	3
100	3
Total	77

Tabla 22 Cantidad de planteles educativos por rangos de avance porcentual en que se encuentran los trabajos desarrollados en los mismos. Fuente: SEDU

# Aportación al ISC para el otorgamiento de Verificaciones de Seguridad Estructural a planteles educativos ubicadas en zonas de mayor riesgo sísmico

SEDU reporta que está en espera de información por parte del ISC para la posterior liberación de los recursos para esta acción por parte de SEFIN.





Derivado que SEFIN asignó recursos de financiamiento a las siguientes acciones aprobadas a SEDU, informa que por esta situación, las dependencias a las que se transmitirían estos recursos (AGU y SOBSE) indicaron que debido a la normatividad aplicable, es poco probable concluir en el presente año dichas acciones, por lo que quedarán pendientes por desarrollarse.

Planes de Acción Aprobados	Monto
Adquisición de materiales y equipamiento para la reconstrucción, rehabilitación y habilitación de escuelas públicas	\$58'000,000.00
Campaña "Respuesta ante una emergencia sísmica" (material didáctico)	\$4'000,000.00
Distribución de gabinetes para la atención emergente de siniestros en escuelas públicas	\$52'000,000.00
Convenio para el diagnóstico e implementación de la estrategia "Hacia una Ciudad del Conocimiento Resiliente"	\$9'000,000.00
Convenio para la implementación de protocolos para la atención de la emergencia en el Sector Educativo	\$9'000,000.00
Aportación al Instituto para la Seguridad de las Construcciones para el otorgamiento de Verificaciones de Seguridad Estructural a planteles educativos de la CDMX.	\$7'505,000.00
TOTAL	\$139'505,000.00

Tabla 23 Acción aprobada por la Comisión Fuente: Vigésimo Novena Sesión Ordinaria.

### Actividades adicionales realizadas por SEDU

Derivado del censo publicado en el mes de julio de 1900 planteles educativos que resultaron afectados, éstos han sido distribuidos por origen de los recursos para su respectiva rehabilitación y/o reconstrucción a las distintas instituciones y organismos educativos, de la manera siguiente:

	Tipo/Nivel Educativo					
Atiende	Preescolar	Primaria	Especial	Secundaria	Normal	Total
AEFCM	255	327	29	142	0	753
CDMX	114	218	4	101	0	437
INIFED	254	316	20	112	1	703
No incluidos en la plataforma						7
Total						1,900

Tabla 24 Censo de escuelas afectadas. Fuente: SEDU





## Actividades del Subcomité de Daños del Sector Educativo y Deportivo del FONDEN

Se tienen 276 planteles educativos coordinados por el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) que serán atendidos de acuerdo a la siguiente tabla:

Tipo de atención	Cantidad	Descripción
Reconstrucción total	9	<ul> <li>4 Contratados por INIFED</li> <li>5 Supervisados por INIFED atendidos por medio de la aseguradora</li> </ul>
Reconstrucción parcial	267	<ul><li>164 Contratados por INIFED</li><li>23 Proceso de contratación</li><li>80 pendientes</li></ul>

Tabla 25 Inmuebles atendidos por SEDU como parte del FONDEN. Fuente: SEDU

#### Infraestructura de Salud

La Secretaría de Salud (SEDESA) reporta 47 instalaciones afectadas por el 19S, de las cuales: 40 resultaron con daños parciales, 2 con daños graves y 5 Centros de Salud reportados con daño total. Los inmuebles se atienden con recursos mixtos (aseguradoras, recursos propios, FONDEN y FONADEN), a excepción de dos Centros de Salud que no cuentan con seguro y requieren reparaciones mayores e incluso su reubicación, para lo cual la Comisión aprobó la acción "Reubicación temporal de los centros de salud Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda".

Respecto a los avances en los trabajos contratados para la adecuación y montaje de las casetas temporales de los dos centros de salud que resultaron afectados por el 19S, la SEDESA reporta lo siguiente:

Instalación de la Caseta Temporal Centro de Salud Santa Rosa Xochiac				
Ubicación del Centro de Salud y de caseta temporal	Calzada Desierto de los Leones N°7615, Col. Santa Rosa Xochiac, Del. Álvaro Obregón.			
Fecha de inicio	27 de julio de 2018.			
Fecha de término	31 de diciembre de 2018.			
Descripción de los trabajos	Una vez construido el firme de desplante, se están colocando los muros perimetrales y se realiza el trazo para muros divisorios en el interior.			
Población que se atenderá	8,610 personas / 810 consultas mensuales.			
Porcentaje avance	35%			

Tabla 26 Descripción de los trabajos para la instalación de la caseta temporal. Fuente: Informe SEDESA







Imagen 10. Vista superior de la caseta temporal del Centro de Salud Santa Rosa Xochiac, colocación de muros perimetrales. Fuente: Comisión



Imagen 11. Vista de la caseta temporal del Centro de Salud Santa Rosa Xochiac, colocación de muros perimetrales. Fuente: Comisión

Instalación de la Caseta Temporal Centro de Salud Dr. Maximiliano Ruiz Castañeda				
Ubicación del Centro de Salud	Calle Benito Juárez S/N, Col. Santa Martha Acatitla, Del. Iztapalapa.			
Ubicación de la Caseta Temporal	Calle 5 de Mayo S/N, Col. Santa Martha Acatitla. Del. Iztapalapa.			
Fecha de inicio	27 de julio de 2018.			
Fecha de término	31 de diciembre de 2018.			
Descripción de los trabajos	Se ingresó al predio donde se instalará la caseta, para el estudio del terreno, el cual está custodiado por la Secretaría de Seguridad Pública.			
Población que se atenderá	40,000 personas / 2,000 consultas mensuales.			
Porcentaje avance	3%			

Tabla 27 Descripción de los trabajos para la instalación de la caseta temporal. Fuente: Informe SEDESA

#### Inmuebles con daños menores

Actualmente SOBSE cuenta con un total de 7,101 cédulas postsísmicas, mismas que se están siendo analizadas por parte de la dependencia, para determinar que efectivamente correspondan al presente programa. Posterior a este análisis se tiene el siguiente avance:

- 2,410 cédulas corresponden al programa y se encuentran en el siguiente proceso:
  - o 2,373 atendidas





- o 34 en reparación
- 3 programadas para reparación
- 4,672 cédulas han sido reclasificadas al no considerarse dentro del programa de atención, teniendo un incremento de 23 cédulas con respecto al informe anterior.
- 3 cédulas se encuentran en proceso de análisis y 16 aún no se visitan.

Considerando las cédulas atendidas y las reclasificadas, el porcentaje de avance en la atención de las mismas es del 99.21%, generando un decremento con respecto al mes anterior de 0.72% debido al incremento de cédulas que actualmente no se han visitado.

## APOYO DE MATERIALES EN INMUEBLES CON DAÑOS MENORES



Fuente: SOBSE - Septiembre 2018

Acción	Monto autorizado (MXN)	Monto ejercido acumulado (MXN)	% de avance
Servicio de atención a daños menores	20,000,000.00	8,207,327.82	41.04%

Tabla 28 Avance financiero acumulado. Fuente: SOBSE.

#### Infraestructura Penitenciaria

La Comisión aprobó en la Décima Sexta Sesión Ordinaria de fecha 23 de mayo de 2018 la acción "Reconstrucción de los Centros Penitenciarios afectados por el pasado sismo del septiembre de 2017" con un importe de \$387,500,000.00, para ello la Subsecretaría del Sistema Penitenciario (sSSP) suscribió 4 contratos, dos para la ejecución de los trabajos y dos para la





supervisión de los mismos, los cuales dieron inicio el 16 de julio del presente año y su conclusión está programada para el 31 de diciembre de 2018.

En la siguiente tabla se muestran los trabajos que se han efectuado indicando su avance físico:

Centro Penitenciario y frentes con trabajos en proceso	Avance físico (%)
Penitenciaría de la CDMX  Trabajos en Edificio de Gobierno, Dormitorios 3, 4, 7 y 9, Servicios Generales (túnel de inspección), Esclusa norte (portón y caseta de vigilancia), pavimentos estacionamiento, sistema de circuito cerrado de TV, preliminares.	35.05%
<ul> <li>Reclusorio Preventivo Varonil Oriente</li> <li>Trabajos en Centro Escolar, Kilómetro de Dormitorios, Kilómetro de Gobierno y muro de contención en Cinturón de Seguridad, Torre de vigilancia 5 y 7.</li> </ul>	31.09%
Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes  Trabajos en Acceso Principal a la Comunidad y tanque elevado.	2.49%
Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan  • Trabajos preliminares en puente Torre Médica	1.85%

Tabla 29 Frentes de trabajo en centros penitenciarios. Fuente: Subsecretaría de Sistema Penitenciario.

Considerando que se tienen dos contratos para la ejecución de los trabajos; uno para la Penitenciaría de la CDMX y otro para el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Comunidad de Diagnóstico Integral para Adolescentes y Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan, se presenta un avance físico de los 4 centros acumulado de **35.24%**, el avance ejecutado en el mes de septiembre es de **23.72%**.

Acción	Monto asignado	Monto ejercido acumulado	% de avance	
Reconstrucción de los centros penitenciarios	\$387,500,000.00	\$108,964,059.14	28.12%	

Tabla 30 Acción aprobada por la Comisión. Fuente: Décima Sexta sesión ordinaria de la Comisión





#### Programa de Verificaciones Presísmicas en Edificios Estratégicos

El ISC, ha dictaminado 12 edificios relevantes desde el pasado mes de mayo, tanto del gobierno de la CDMX como del gobierno Federal, mismos que son susceptibles a ser incorporados en este programa, los cuales, mediante un sistema de simulación se analizará el comportamiento ante diferentes tipos de sismos.

Los 12 inmuebles referidos corresponden a los siguientes tipos:



#### Fuente: ISC - Septiembre 2018

## Proyectos de Reconstrucción

SEDUVI, de acuerdo a los "Lineamientos y Tabulador de pagos de proyectos de rehabilitación y reconstrucción, para inmuebles afectados por el "Fenómeno Sísmico del Diecinueve de Septiembre de Dos Mil Diecisiete", indicó que al corte del mes de septiembre, presentó ante la Comisión, 28 expedientes para el pago de proyecto ejecutivo y 9 más durante el mes de octubre, de los cuales ya se dio la procedencia por parte de la Comisión, teniendo un total al corte de la Trigésima Sexta sesión ordinaria de 37 expedientes de inmuebles procedentes, que se enlistan a continuación:

Item	Inmueble	Sesión	Estatus
1	Coquimbo 911 Colonia Lindavista Norte, Delegación Gustavo A. Madero	23 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
2	Boulevard Xola No. 32, colonia Álamos, Delegación Benito Juárez	23 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
3	Galicia No. 245, colonia Álamos, Delegación Benito Juárez, CP. 03400	24 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado





Item	Inmueble	Sesión	Estatus
4	Sinaloa 120, colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P.6700	24 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
5	Prolongación Petén 915, Col. Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez	27 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
6	Nautla 28, Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc	27ª	1ra parte (40%) del pago ejecutado
7	Toluca 28, Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc	27 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
8	Avenida Pacífico 223, Los Reyes, Delegación Benito Juárez	28 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
9	Canal de Miramontes 3010, Girasoles III, Delegación Coyoacán	28 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
10	Enrique Rébsamen 241 Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez	29 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
11	Escocia 29, Parque San Andrés, Delegación Coyoacán	29 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
12	Paseos de las Higueras 89, Col. Paseos de Taxqueña, Delegación Coyoacán	29 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
13	Tokio 517, Portales Norte, Delegación Benito Juárez	31 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
14	Azores 609, Portales Norte, Delegación Benito Juárez	32 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
15	La Quemada 81, Narvarte Oriente, Delegación Benito Juárez	32ª	1ra parte (40%) del pago ejecutado
16	Monrovia 1207, Portales Norte, Delegación Benito Juárez	32ª	1ra parte (40%) del pago ejecutado
17	Paz Montes de Oca 93, General Anaya, Benito Juárez	32ª	1ra parte (40%) del pago ejecutado
18	Paseos del Río 10, Paseos de Taxqueña, Delegación Coyoacán	32ª	1ra parte (40%) del pago ejecutado
19	Paseo de los Laureles 187, Col. Paseos de Taxqueña, Delegación Coyoacán, C.P. 04250	32 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
20	Rumania 918, Col. Portales Sur, Delegación Benito Juárez, C.P. 03300	32 <sup>a</sup>	1ra parte (40%) del pago ejecutado
21	Nicolás San Juan 308, Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez	33ª	Procedencia
22	Concepción Beístegui 1503, Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez	33 <sup>a</sup>	Procedencia





Item	Inmueble	Sesión	Estatus
23	Galicia 253, Älamos, Delegación Benito Juárez	33ª	Procedencia
24	Avenida Niños Héroes de Chapultepec 173, Niños Héroes, Delegación Benito Juárez	33 <sup>a</sup>	Procedencia
25	Patricio Sanz 612, Del Valle Centro, Delegación Benito Juárez	33ª	Procedencia
26	Avenida Pacífico 455, La Candelaria, Delegación Coyoacán	33ª	Procedencia
27	Rancho del Arco 32, Los Girasoles, Delegación Coyoacán	33ª	Procedencia
28	Hacienda de la Escalera 5, Col. Prado Coapa, Delegación Tlalpan, C.P. 14357	33ª	Procedencia
29	Patricio Sanz 37, Col del Valle Norte, Del. Benito Juárez	34 <sup>a</sup>	Procedencia
30	Dr. José María Vertiz 1258, Col. Letrán Valle, Del. Benito Juárez	34 <sup>a</sup>	Procedencia
31	Paseo de las Galias 27, Col. Loma Estrella, Del. Iztapalapa	34 <sup>a</sup>	Procedencia
32	Av. México 4, Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc	34 <sup>a</sup>	Procedencia
33	Edimburgo 4, Del Valle Centro, Delegación Benito Juárez	35 <sup>a</sup>	Procedencia
34	General Manuel Rincón 142, General Pedro María Anaya, Delegación Benito Juárez	35 <sup>a</sup>	Procedencia
35	Antillas 1006, Col. Portales Sur, Delegación Benito Juárez	35 <sup>a</sup>	Procedencia
37	Balboa No. 1016, Portales Sur, Benito Juárez, C.P 03300	35 <sup>a</sup>	Procedencia
36	Sinaloa 95, Col. Roma Norte	36ª	Procedencia

Tabla 31 Estatus de inmuebles con procedencia para el otorgamiento de apoyo para pago de proyecto ejecutivo. Fuente: SEDUVI, Trigésima Cuarta sesión Ordinaria.

Acción	Monto autorizado (MXN)	Monto ejercido acumulado (MXN)	% de avance
Proyectos ejecutivos de Reconstrucción.	110,000,000.00	12,347,549.83	11.23

Tabla 32 Avance financiero acumulado. Fuente: SEDUVI.







## I.6 FINANCIERO

Durante el periodo se presentaron los siguientes cambios:

- Cancelación a SEDUVI de la acción "Apoyos económicos como fondo de arranque de reconstrucción de inmuebles de vivienda multifamiliar" por un monto de \$140,000,000,000.00, y redireccionamiento del mismo al Fideicomiso Público.
- Aprobación de la ampliación de la acción de "Demoliciones de edificios", a SOBSE por un monto de \$60.000.000.00.
- Redireccionamiento de \$184,000,000.00 de la acción "Otorgamiento de ayuda de renta" para la acción "Créditos emergentes para la reconstrucción de vivienda", ambas a cargo de INVI.
- Aprobación al INVI de la acción "Programa piloto de carácter temporal para el otorgamiento de financiamiento no recuperable hasta por \$450,000.00, para la reconstrucción de vivienda en lote familiar dentro del Programa de Mejoramiento de Vivienda" por un monto de \$13,500,000.00.
- Aprobación a INVI de la acción "Otorgamiento de financiamiento no recuperable a través del programa de vivienda en conjunto para la edificación del edificio 1C del Multifamiliar Tlalpan" por un monto de \$30,000,000.00, los cuales fueron redireccionados desde la acción "Créditos emergentes para la reconstrucción de vivienda".

Considerando las anteriores modificaciones, la Comisión tiene aprobadas hasta este momento 48 acciones equivalentes a un monto de \$5,576,289,864.12, más los \$100,000,000.00 reservados para el FONADEN de la siguiente manera:

Dependencia	Cantidad de acciones	Monto autorizado MXN	% con respecto al Presupuesto 2018²	Monto ejercido MXN	Monto remanente MXN
SACMEX	3	544,296,869.78	8	0	\$544,296,869.78
SOBSE	10	947,379,742.00	14	\$335,130,940.44	\$612,248,801.56
AGU	5	1,208,120,745.87	18	\$458,089,140.55	\$750,031,605.32
SEDUVI	7	1,005,273,222.41	15	\$103,651,997.47	\$901,621,224.94
SEDU	9	277,000,000.00	4	0	\$277,000,000.00
INVEA	1	63,000,000.00	1	0	\$63,000,000.00
INVI	5	963,500,000.00	14	\$557,416,000.00	\$406,084,000.00
ISC	2	130,645,000.00	2	0	\$130,645,000.00
SEDESA	2	2,601,477.06	0	0	\$2,601,477.06

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Presupuesto 2018 (Art. 14 Ley) = **\$ 6,855,925,061.00** 





Dependencia	Cantidad de acciones	Monto autorizado MXN	% con respecto al Presupuesto 2018 <sup>2</sup>	Monto ejercido MXN	Monto remanente MXN
SEGOB	1	387,500,000.00	6	\$108,964,059.14	\$278,535,940.86
SEDECO	2	8,035,000.00	0.1	0	\$8,035,000.00
CEJUR	1	38,937,807.00	1	0	\$38,937,807.00
SEFIN <sup>3</sup>	N/A	100,000,000.00	1	0	\$100,000,000.00
	48	\$5,676,289,864.12	83%	\$1,563,252,137.60	\$4,113,037,726.52


Tabla 33 Avance financiero por dependencia, ejercicio 2018. Fuente: Informes dependencias - septiembre 2018.

El avance del ejercicio de los recursos representa el 27.54% con respecto al monto total autorizado.

Se hace la aclaración, que los montos ejercidos acumulados de algunas de las acciones a cargo de SOBSE e INVI presentan un decremento con respecto al mes anterior, esto debido a que en su último informe, presentaron el desglose de los montos ejercidos y del fondo del cual han realizado dicho ejercicio de gasto (otros fondos y Fondo de Reconstrucción), por lo tanto, estos montos ejercidos plasmados en la tabla 33, gráfico 1 y 2, corresponden exclusivamente a aquellas acciones que han sido ejecutadas con cargo al Fondo de Reconstrucción.

## AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA 2018

(Montos en millones de pesos)

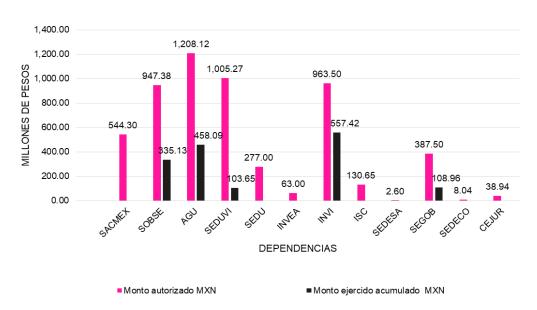


Gráfica 1: Avance financiero por dependencia, ejercicio 2018. Fuente: Informes dependencias - octubre 2018.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Recurso asignado al FONADEN (art. 14 fracción I del Presupuesto de Egresos de la CDMX 2018)





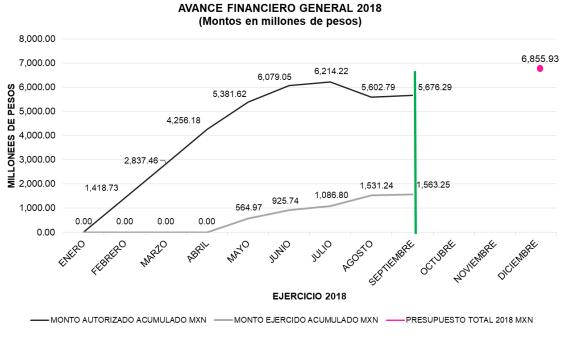

#### Gráfica 2: Avance financiero general, ejercicio 2018. Fuente: Informes dependencias - octubre 2018.

#### Apoyo para renta

Para la segunda etapa de este programa, se ha erogado un total de \$74,584,000.00, correspondientes a la entrega de 18,646 cheques, por un importe de \$4,000.00 cada uno.

La meta considerada para esta acción cambió a consecuencia de la disminución del monto de \$300,000,000.00 a \$116,000,000.00, los cuales corresponden a 29,000 ayudas de \$4,000.00 cada una.








### Apoyo y Gestión Crediticia

El INVI ha entregado **\$1,047,950,000.00** correspondientes a 7,571 créditos de noviembre de 2017 a septiembre de 2018, como parte del otorgamiento de "Créditos Emergentes de Reparación de Vivienda" (CERV), de la siguiente manera:

- a) Ejercicio 2017: De noviembre a diciembre, entregó 591 créditos por un monto de \$80,980,000.00.
- **b) Ejercicio 2018:** De enero a septiembre, se entregaron 6,980 créditos por un monto de \$966,970,000.00.
- c) La meta considerada al 30 de noviembre de 2018, es de 10,356 créditos, lo que se traduce en un importe total estimado de \$1,437,850,000.00.

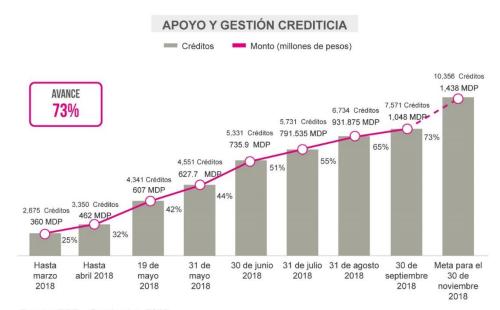

Fuente: INVI - Septiembre 2018





### Otorgamiento del Seguro de Desempleo

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), ha entregado desde el mes de enero del presente año, 660 apoyos económicos por un importe de \$4,836.00 cada uno, a personas trabajadoras (locatarias y empleadas) de mercados públicos, dando como resultado un monto acumulado de \$1,595,880.00 que representa el 44.90%.

Acción	Monto asignado (MXN)	Monto ejercido acumulado (MXN)	% de avance
Seguro de desempleo	3,554,460.00	1,595,880.00	44.90

Tabla 34 Avance financiero acumulado. Fuente: STyFE.

## Servicios de Coordinación Técnica y de Campo

Para atender los requerimientos de registro, atención de visitas de valoración y a reportes de reparaciones, la Comisión aprobó a SOBSE, las siguientes 2 acciones:

Acción	Monto autorizado	Monto ejercido acumulado	% de avance
Apoyo técnico	\$18,500,000.00	\$9,250,000.00	50.00%
Servicios de coordinación técnica y de campo para demoliciones, reestructuraciones y reparaciones de inmuebles afectados en Tláhuac y Xochimilco.	\$36,000,000.00	\$35,998,024.58	99.99%
TOTAL	\$54,500,000.00	\$47,248,024.58	86.69%

Tabla 35 Avance financiero acumulado. Fuente: SOBSE. La reducción del monto ejercido de la acción "Apoyo Técnico" con respecto al mes anterior, corresponde al ajuste por la determinación del ejercicio de los montos de acciones aprobadas por la Comisión.







#### 1.7 PROSPECTIVA DE RESILIENCIA

PROSOC viene trabajando de manera continua en la formación de ciudadanos resilientes, para que cuenten con capacidades de detección de riesgos, reacción ante eventos inesperados, asimilación de hechos ocurridos, y sobretodo que puedan de manera pronta, reponerse y ayudar a su comunidad. Para lo cual reporta las siguientes acciones:

#### PLAN FAMILIAR - ACCIONES RESILIENTES PROSOC

	Acumulado Agosto 2018	Acumulado Septiembre 2018
Mujeres capacitadas	+ 1,097	+ 1,177
Hombres capacitados	+ 643	+ 683
	1,446	1,646

Fuente: PROSOC - Septiembre 2018

# CURSOS DE PROTECCIÓN CIVIL – ACCIONES RESILIENTES PROSOC



Fuente: PROSOC - Septiembre 2018







## I.8 MATRIZ NORMATIVA FENÓMENO SÍSMICO 17 DE OCTUBRE 2017

	Información reportada del 20 de septiembre al 17 de octubre de 2018					
	Publicació	ón en Gaceta				
No.	No.	Fecha	Título	Dependencia		
1	No. 413	20-09-18	Aviso por el cual se da a Conocer Nota Aclaratoria a los Lineamientos Generales de la Acción Institucional para el Otorgamiento de Ayudas denominada, "Intervención Social Inmediata CDMX", para el Ejercicio Fiscal 2018; publicados el 7 de Septiembre de 2018, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.	Secretaría de Desarrollo Social		
2	No. 413	20-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por motivo del Sismo del 19 de septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Benito Juárez, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.	Oficialía Mayor		
3	No. 413	20-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por motivo del Sismo del 19 de septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Cuajimalpa de Morelos,	Oficialía Mayor		





	Información reportada del 20 de septiembre al 17 de octubre de 2018					
	Publicacio	ón en Gaceta				
No.	No.	Fecha	Título	Dependencia		
			que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.			
4	No. 413	20-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por motivo del Sismo del 19 de septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Azcapotzalco, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.	Oficialía Mayor		
5	No. 414	21-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados, "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto horizontal por motivo del Sismo del 19 de septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Iztacalco, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.	Oficialía Mayor		
6	No. 414	21-09-18	Aviso por el que se dan a conocer Dos Trámites denominados, "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en	Oficialía Mayor		





	Información reportada del 20 de septiembre al 17 de octubre de 2018					
	Publicació	ón en Gaceta				
No.	No.	Fecha	Título	Dependencia		
			Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por motivo del Sismo del 19 de septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios del Distrito Federal.			
7	No. 414	21-09-18	Nota Aclaratoria al Aviso por el que se dan a Conocer los Lineamientos y Mecanismos de Operación para Ejercer el Recurso Adicional, correspondiente al Fondo 150175 "No Etiquetado Recursos Federales Participaciones a Entidades Federativas y Municipios Participaciones en Ingresos Federales 2017, liquida de Remanentes Principal: "Ayuda Social para Realizar Acciones de Mitigación a Casas Dañadas por los Sismos de Septiembre 2017, valoradas de Riesgo Medio", a través de la Dirección de Protección Civil; publicado en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, el Día el 11 de Septiembre de 2018.	Delegación Iztapalapa		
8	No. 415	24-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados, "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por Motivo del Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y	Oficialía Mayor		





Información reportada del 20 de septiembre al 17 de octubre de 2018				
No.	Publicación en Gaceta			
	No.	Fecha	Título	Dependencia
			Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.	
9	No. 415	24-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por Motivo del Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Álvaro Obregón, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal	Oficialía Mayor
10	No. 418	27-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados, "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 De Septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por Motivo del Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.	Oficialía Mayor
11	No. 418	27-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados, "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la	Oficialía Mayor





Información reportada del 20 de septiembre al 17 de octubre de 2018				
	Publicación en Gaceta			
No.	No.	Fecha	Título	Dependencia
			Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por Motivo del Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en la Magdalena Contreras, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.	
12	No. 418	27-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados, "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por Motivo del Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Xochimilco, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.	Oficialía Mayor
13	No. 419	28-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados, "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por Motivo del Sismo del 19 De septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Iztapalapa, que han obtenido la Constancia de Registro en el	Oficialía Mayor





	Información reportada del 20 de septiembre al 17 de octubre de 2018				
	Publicación en Gaceta				
No.	No.	Fecha	Título	Dependencia	
			Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.		
14	No. 419	28-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados, "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por Motivo del Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Miguel Hidalgo, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.	Oficialía Mayor	
15	No. 419	28-09-18	Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados, "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por Motivo del Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Tláhuac, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.	Oficialía Mayor	
16	No. 419	28-09-18	Aviso por el que se da a Conocer Un Trámite denominado, "Registro de Manifestación de Reconstrucción, Prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra; para la Reconstrucción de Vivienda Multifamiliar	Oficialía Mayor	





Información reportada del 20 de septiembre al 17 de octubre de 2018				
	Publicación en Gaceta			
No.	No.	Fecha	Título	Dependencia
			Sujeta al Régimen de Propiedad en Condominio o Copropiedad, por Motivo del Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y su Formato de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, que ha obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.	
17	No. 419	28-09-18	Aviso por el que se da a Conocer el Trámite denominado, "Diagnóstico Socioeconómico para la Solicitud de Apoyo Económico para Proyectos de Rehabilitación Aprobados por la Comisión de Reconstrucción que Hayan Sufrido Daños con Motivo del Sismo del 19 de Septiembre de 2017", que presta la Subsecretaría de Participación Ciudadana de la Secretaría de Desarrollo Social, que ha obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal.	Oficialía Mayor
18	No. 419	28-09-18	Aviso por el que se da a Conocer el Programa Social, "Semillas, Material Vegetativo y Fertilizante Orgánico", que Otorga el Órgano Político Administrativo en Xochimilco, que ha obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de Trámites y Servicios de la Ciudad de México (Relacionado con el Aviso por el cual se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Social Específico "Semillas, Material Vegetativo y Fertilizante Orgánico" para el Ejercicio 2018.	Oficialía Mayor
19	No. 420	1°-10-18	Aviso por el cual se da a Conocer la Nota Aclaratoria de los Lineamientos de la Acción Institucional "Apoyo Emergente para Habitantes de Tlalpan Afectados por El Sismo del 19 de Septiembre"	Delegación Tlalpan
20	No. 423	04-10-18	Decreto por el que se Derogan y Reforman Diversas Disposiciones del Decreto de	Jefatura de Gobierno





	Información reportada del 20 de septiembre al 17 de octubre de 2018				
	Publicación en Gaceta				
No.	No.	Fecha	Título	Dependencia	
			Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2018.		
21	No. 426	09-10-18	Nota Aclaratoria relativa al "Aviso por el que se dan a Conocer Dos Trámites denominados, "Registro de Manifestación de Reconstrucción para Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal, prórroga del Registro y Aviso de Terminación de Obra para la Reconstrucción de Vivienda Afectada por el Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y "Aviso de Rehabilitación Estructural de Vivienda Unifamiliar o Plurifamiliar en Conjunto Horizontal por Motivo del Sismo del 19 de Septiembre de 2017" y sus Formatos de Solicitud, que presta el Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, que han obtenido la Constancia de Registro en el Registro Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual de Trámites y Servicios al Público del Distrito Federal", publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de fecha Veintisiete de Septiembre de 2018.	Oficialía Mayor	
22	No. 426	09-10-18	Acuerdo por el que se Suspenden Términos para Recepción y Práctica de Procedimientos Administrativos de Trámites y Servicios.	Alcaldía en Tlalpan	
23	No. 429	12-10-18	Acuerdo por el que se Suspenden Términos para la Recepción de Trámites y Procedimientos en Materia de Construcciones y Obras en la Unidad Administrativa denominada Ventanilla Única.	Alcaldía en Tláhuac	
24	No.430	15-10-18	Aviso por el que se dan a Conocer las Modificaciones a las Reglas de Operación del Programa Social "Seguro de Desempleo", para el Ejercicio Fiscal 2018, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, Tomo I, de Fecha 31 de Enero y de Fecha 30 de Mayo, ambas de 2018.	Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo	
25	No. 431	16-10-18	Aviso por el cual, se dan a Conocer las Modificaciones a los Lineamientos	Secretaría de Desarrollo Social	





Información reportada del 20 de septiembre al 17 de octubre de 2018				
	Publicación en Gaceta			
No.	No.	Fecha	Título	Dependencia
			Generales de la Acción Institucional para el Otorgamiento de Ayudas denominada, "Intervención Social Inmediata CDMX", para el Ejercicio Fiscal 2018, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 26 de Marzo de 2018.	
26	No. 431	16-10-18	Acuerdo por el que se Suspenden Términos para la Recepción de los Trámites en Materia de Construcciones y Obras que se Indican; en la Ventanilla Única.	Alcaldía en La Magdalena Contreras
27	No. 432	17-10-18	Acuerdo por el que se Suspenden Términos para la Recepción de Trámites y Procedimientos en Materia de Construcciones y Obras en la Unidad Administrativa denominada, Coordinación de Ventanilla Única.	Alcaldía en Azcapotzalco
